

## قسم النطاقات العالمية - إطار عمل تنفيذ سياسة الإجماع (تم التحديث في كانون الأول (ديسمبر) 2018)

أ. الأهداف والغايات: تم تصميم إطار عمل تنفيذ سياسة إجماع مؤسسة ICANN من أجل دعم إمكانية التنبؤ، والمساءلة والشفافية والفاعلية في عملية تنفيذ سياسة الإجماع.


### مبادئ العمل:

- أ. يجب أن يكون تنفيذ مؤسسة ICANN لتوصيات سياسة إجماع GNSO شفافاً في جميع دورة حياة المشروع.<sup>1</sup> تعتبر اتصالات مؤسسة ICANN فيما يخص حالة التنفيذ - بما في ذلك فريق مراجعة التنفيذ ومجلس GNSO - من المكونات الأساسية في دورة حياة التنفيذ من البداية إلى النهاية.
- ب. تسعى مؤسسة ICANN إلى متابعة الخطاب والهدف من توصيات سياسة إجماع GNSO عند تنفيذ توصيات سياسة الإجماع. وتحمل مؤسسة ICANN المسؤولية أمام مجلس GNSO (أو وكيله، مثل فريق مراجعة التنفيذ) لضمان أن يكون تنفيذ السياسات متسق مع توصيات السياسة وتحديد أسباب التركيز على توصيات السياسة وفقاً لما هو موضح في التقرير النهائي. في حالة الشك بشأن الهدف من وراء توصية السياسات، فسوف يقوم فريق العمل بالتشاور مع فريق قسم النطاقات العالمية من أجل توضيح هذا الهدف.
- ج. وسوف تستخدم مؤسسة ICANN إطار عمل تنفيذ سياسة الإجماع كدليل عند تنفيذ توصيات سياسة الإجماع. كما سيتبع فريق قسم النطاقات العالمية قائمة بالعناصر، الموضحة أدناه، لضمان اتباع جميع الخطوات الضرورية خلال كل مرحلة من مراحل التنفيذ قبل أن يتوجب على الأطراف المتعاقدة تنفيذ أي سياسة للإجماع.
- د. ويجب أن تضمن عملية التنفيذ أن تكون نزاهة توصية (توصيات) سياسة الإجماع مصانة حيث يتم نقلها إلى عمليات ونظم ومعايير قابلة للتنفيذ. ويجب أن تؤدي عملية التنفيذ إلى تمكين فريق العمل من تخطيط قدرات الموارد اللازمة وإدارتها لتجميع وبناء واختبار ونشر الإصدار في عملية الإنتاج ووضع الخدمة (الخدمات) وهيكلة الدعم.
- هـ. وستتبع مؤسسة ICANN عملية انتقال رسمية (لفريق سياسة GNSO إلى قسم النطاقات العالمية (GDD)، وتنفيذ قسم النطاقات العالمية (GDD)، وقسم النطاقات العالمية للامتثال التعاقدية) وذلك للاستخدام من قبل رعاة المشروع عند تنفيذ كل مشروع تنفيذ جديد.
- و. يجب أن تتبع أنشطة تنفيذ السياسات دورة حياة بما يتفق مع مراحل أو أكر التنفيذ القياسية. ولدعم جهود التنفيذ التي تقوم بها الأطراف المتعاقدة، يجب تنسيق أنشطة تنفيذ السياسات بأكثر قدر ممكن بما يتفق مع دورات النشر والمواعيد النهائية للتنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الأنشطة أو الأحداث الأخرى ذات الصلة مع أطر زمنية متضاربة أو متزامنة.
- ز. ويجب نشر أي تغيير أو إصدار يكون مطلوباً بسبب مشكلات تتعلق بالأمن أو الاستقرار بشكل سريع، حسب سياسات الإجماع ومواصفات السياسات المؤقتة داخل اتفاقية السجل واتفاقية اعتماد أمين السجل. وفي تلك الحالات، يجب على مؤسسة ICANN التعاون مع المجتمع والنظر في تضيق الخناق على عمليات التنفيذ الأخرى في خط الأنابيب من أجل تسهيل أعباء التغييرات الطارئة.
- ح. وسوف تراجع مؤسسة ICANN إطار عمل التنفيذ بشكل مستمر وكذلك المواد ذات الصلة لتجميع ممارسات أفضل إضافية أو تعديل الخطوات نتيجة الدروس المستفادة من مشاريع سياسة التوافق في الآراء السابقة. وسيتاح الإصدار الحالي من إطار العمل هذا على صفحة الويب الخاصة بمؤسسة ICANN [www.icann.org/policy/implementation](http://www.icann.org/policy/implementation).

<sup>1</sup> مزيد من المعلومات حول عملية وضع سياسة إجماع GNSO متوفر على <http://gns0.icann.org/en/basics/consensus-policy/pdp>

- أ. مجلس GNSO: يتحمل مجلس GNSO المسؤولية عن وضع والتوصية بالسياسات الأساسية لمجلس إدارة ICANN فيما يتعلق بنطاقات المستوى الأعلى العام. وبمجرد الاعتماد من جانب مجلس الإدارة، سيعمل مجلس GNSO باعتباره مصدرًا لفريق العمل الذي لديه أسئلة حول الخلفية أو الهدف من توصيات السياسة خلال عملية التنفيذ. ويجوز لمجلس GNSO مواصلة توفير التعقيبات على تنفيذ السياسات، على سبيل المثال في حال تراءى لمجلس GNSO أن التنفيذ غير متسق مع السياسة.
- ب. مؤسسة ("ICANN org") ICANN: تركز مؤسسة ICANN وفريق العمل والموارد على: دعم وضع السياسات، وإدارة الأحداث، ودعم أمين السجل والسجل، ودعم المجتمع، والامتثال للعقود، ووظائف IANA، والتوعية وبناء القدرات، والخدمات الخارجية للمجتمع الأشمل، وخدمات فريق العمل الداخلية. تنفذ مؤسسة ICANN توصيات المجتمع بناءً على توجيهات مجلس الإدارة وتحت إشراف المدير التنفيذي.
- ج. فريق سياسات GNSO: يدعم فريق عمل السياسات GNSO فيما تقوم به من أنشطة لوضع السياسات. وعلى هذا النحو، فإن فريق عمل السياسة هو المسئول عن التعامل مع سياسات GNSO من أجل التنفيذ إلى فريق عمل قسم النطاقات العالمية بمجرد اعتماد مجلس الإدارة للسياسات. ويمكن أن يعمل فريق عمل السياسات كذلك كمصدر لفريق GDD في حال ظهرت أية أسئلة تحيط بهدف أو تاريخ أي توصية للسياسة.
- د. فريق عمل قسم النطاقات العالمية (GDD): يتحمل قسم النطاقات العالمية المسؤولية عن دورة الحياة الكاملة للتنفيذ، من إنشاء خطة تنفيذ، والمشاركة في فريق مراجعة التنفيذ (IRT) (إن وجد أي واحد)، والتشاور مع فريق عمل مؤسسة ICANN المعني وأي من الأطراف الخارجية الأخرى المطلوبة، وإجراء عملية توعية حول التنفيذ، بما في ذلك التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة المعنيين فيما يخص سير أعمال التنفيذ.
- هـ. فريق مراجعة التنفيذ (IRT): يعمل فريق مراجعة التنفيذ في حالة تشكيله بمعرفة مجلس GNSO، كمصدر لفريق التنفيذ حول السياسات والأسئلة الفنية التي قد تظهر. وسوف يتألف فريق مراجعة التنفيذ بشكل نموذجي - على سبيل المثال لا الحصر - من متطوعين كانوا مشاركين كذلك في وضع توصيات السياسة. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يعمل فريق IRT كمصدر لفريق العمل على خلفية ومنطق توصيات السياسة والعودة إلى مجلس GNSO في أية إرشادات إضافية حسب الطلب. ومتى ما كان ذلك ذي صلة، يجب أن يحتوي IRT أيضًا على خبراء فنيين أو متخصصون والأطراف المتعاقدة التي يمكن أن تساعد فريق العمل في تخطيط التنفيذ الفني لتغييرات السياسة.
- و. منظمات الدعم واللجان الاستشارية التابعة لـ ICANN: يجوز لمنظمات الدعم/اللجان الاستشارية أن تعمل كمصدر لمؤسسة ICANN خلال التنفيذ حسب احتياجات المشروعات الخاصة. مكتب الاستشاري العام: سوف يقوم فريق العمل القانوني بمراجعة كل صياغة السياسة المعدلة لضمان أن جميع التغييرات صحيحة من الناحية القانونية وأن التعديلات لن تتسبب في مشكلات بموجب أي من السياسات أو العقود الأخرى.
- ح. مكتب الاستشاري العام: يشارك فريق عمل الامتثال التعاقد في دورة حياة التنفيذ من أجل ضمان أن التغييرات يتم تنفيذها بطريقة تؤدي إلى إيجاد التزامات واضحة ونافذة على الأطراف المتعاقدة (وأيضًا بطريقة يمكن تعقبها بفاعلية وتكون نافذة على الامتثال). يفرض الامتثال سياسات الإجماع المنفذة، فضلاً عن توفير المقاييس والتقارير لتمكين مراجعات ما بعد التنفيذ لفعالية السياسة.
- ط. إدارة المخاطر بالشركات (ERM): ستساعد إدارة المخاطر المؤسسية عند الحاجة في تسهيل مراجعة السياسات والخدمات الجديدة لتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها.
- ي. مزودو الخدمات الخارجيين: يجوز للمتعاقدين تنفيذ أو عرض و/أو دعم الخدمات حسب توجيه مؤسسة ICANN. ويمكن أن نتوقع من هؤلاء المتعاقدين توفير توصيات حول مدى جدوى بعض الأساليب أو المساعدة في الحلول المقترحة للمشكلات المطروحة خلال التنفيذ.

إطار عمل تنفيذ سياسة التوافق في الآراء

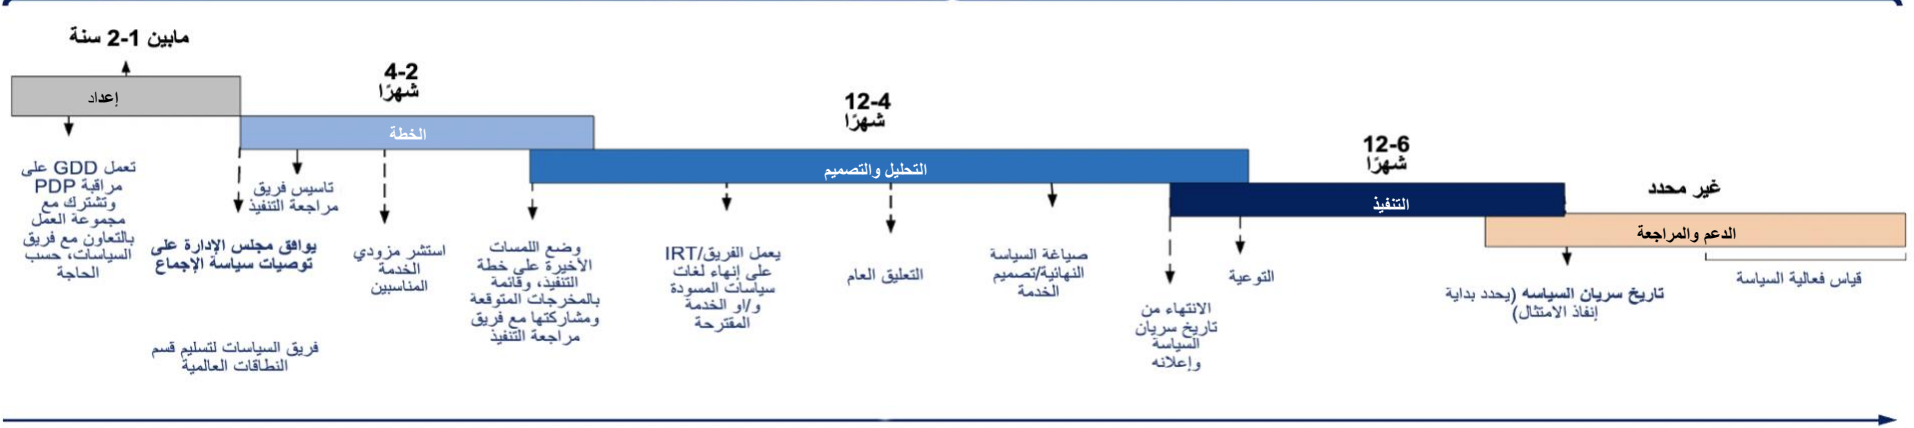

- **إعداد:** سيتابع موظف قسم النطاقات العالمية (GDD) المخصص - المشار إليه فيما بعد بـ "مسؤول الاتصال التنفيذي" - أنشطة وضع السياسات للمشاركة في الأمور المتعلقة بالتنفيذ، حسب الاقتضاء. سوف يتم إجراء الدراسة والتعقيبات على منتجات أعمال السياسات وتوصيات سياسة الإجماع حيث ترتبط بالتنفيذ وذلك من خلال مراحل متعددة من عملية وضع السياسات لـ GNSO. تأتي موافقة مجلس الإدارة على توصيات سياسة الإجماع ختامًا للنهاية الرسمية لهذه المرحلة.
- **الخطة:** يقوم فريق السياسة وقسم النطاقات العالمية بالترتيب لتعيين فريق IRT في بداية هذه المرحلة. يقوم فريق السياسات رسميًا بتسليم المشروع إلى قسم النطاقات العالمية من أجل التنفيذ. وسوف يقوم فريق قسم النطاقات العالمية بتنظيم الأنشطة اللازمة لتنفيذ توصيات سياسة الإجماع. تعتبر خطة المشروع ذات الهيكل التفصيلي الكامل للعمل هي الناتج الأساسي، بما في ذلك مسودة وثيقة المتطلبات. ستحدث اتصالات قسم النطاقات العالمية الأولية مع مزودي الخدمة ذوي الصلة وفريق مراجعة التنفيذ (IRT) خلال هذه المرحلة. ويتم الانتهاء من هذه المرحلة عندما يتم نشر خطة مشروع التنفيذ.
- **التحليل والتصميم:** سوف يعمل فريق عمل GDD مع فريق مراجعة التنفيذ IRT، في حالة تشكيله، خلال هذه المرحلة من أجل تطوير وإكمال صياغة سياسة الإجماع الجديدة (إذا كانت مرغوبة) وأي من الخدمات الجديدة التي قد تكون موجودة. سوف يتم أيضًا طلب التعليقات العامة فيما يخص التنفيذ في هذه المرحلة. ويتم الانتهاء من هذه المرحلة عند التنفيذ النهائي والإعلان عن تاريخ السريان.
- **التنفيذ:** سوف يعلن فريق عمل قسم النطاقات العالمية عن تفاصيل التنفيذ النهائي إلى المجتمع وإجراء التواصل المستهدف للأطراف المتعاقدة خلال هذه المرحلة. تكتمل هذه المرحلة عندما تدخل سياسة الإجماع حيز التنفيذ ويبدأ الامتثال في أنشطة إنفاذ السياسة وإعداد التقارير.
- **الدعم والمراجعة:** قد يعمل فريق عمل قسم النطاقات العالمية (GDD) باعتباره مورد داخلي بالإضافة إلى مورد للأطراف المتعاقدة في الأمور المتعلقة بتنفيذ وتفسير سياسة الإجماع المنفذة. كما يجوز لفريق عمل قسم النطاقات العالمية مراجعة عمليات تنفيذ سياسة الإجماع.



مرحلة	الخطوة	المسئول	الشروط
إعداد	توفير التعقيبات على تقارير المشكلات الأولية المقدمة من فريق العمل	فريق عمل GDD	سوف يقوم عضو فريق عمل قسم النطاقات العالمية المخصص بمراقبة إنشاء فريق السياسات لتقارير المشكلات وتقديم التعقيبات بالنيابة عن فريق (فرق) العمل حسيما يتناسب. سيقوم "منسق التنفيذ" هذا بمراقبة وتنسيق مدخلات قسم النطاقات العالمية على منتجات عمل عملية وضع السياسة (PDP)، وستكون بمثابة نقطة اتصال رسمية بين مجموعات عمل عملية وضع السياسة (PDP) وموظفي قسم النطاقات العالمية.
إعداد	متابعة مشروعات وضع السياسات مع التركيز عملية التنفيذ	فريق عمل قسم النطاقات العالمية	سيقوم المنسق التنفيذي بمراقبة أنشطة عملية وضع السياسات مع التركيز على مشكلات التنفيذ. يجب أن يشارك مسؤول الاتصال في مناقشات عملية وضع السياسات كما هو مطلوب لمشاركة منظور التنفيذ.
إعداد	توفير التعقيبات على تقرير PDP الأولي لـ GNSO	فريق عمل قسم النطاقات العالمية	سينسق مسؤول الاتصال المعني بتنفيذ مساهمات الفرق في التقرير الأولي لعملية وضع سياسات نطاق GNSO.
إعداد	توفير التعقيبات على تقرير عملية وضع السياسات (PDP) النهائي لنطاق GNSO	فريق عمل قسم النطاقات العالمية	سينسق مسؤول الاتصال المعني بتنفيذ مساهمات الفرق في التقرير الأولي لعملية وضع سياسات نطاق GNSO.
إعداد	تقديم المساهمات وإعداد المواد للنظر فيها من قبل مجلس الإدارة	فريق عمل قسم النطاقات العالمية	سينسق مسؤول الاتصال المعني بالتنفيذ مدخلات الفرق بشأن المواد لإعداد مجلس إدارة ICANN للنظر في توصيات سياسة الإجماع ونصائح المنظمات الداعمة/اللجان الاستشارية الأخرى، عند الضرورة.
الخطة	تعيين لفريق مراجعة التنفيذ (إذ كان منطبقاً)	فريق سياسة GNSO، فريق GDD	<p>سوف يقوم فريق سياسة GNSO، بالتشاور مع فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بإطلاق دعوة لمتطوعي IRT وإنشاء ملف تفصيلي لفريق IRT<sup>2</sup>. سوف يتشاور فريق قسم النطاقات العالمية مع فريق IRT فيما يخص جدول الاجتماعات وعقد جلسة واحدة أو اثنتان من الجلسات المخصصة لإقرار اتفاق على قواعد المشاركة ومواد التسليم الخاصة بفريق IRT.</p> <p>وفي هذه المرحلة، سينظم قائد المشروع جميع الأنشطة الإدارية المتعلقة بالعمل مع فريق مراجعة التنفيذ، بما في ذلك:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إنشاء ويكي المجتمعية</li> <li>• تعيين فريق مشروع التنفيذ (IPT) المخصص للموظفين فقط للمساعدة في تخطيط المشروع وصياغة السياسات</li> <li>• خدمات السكرتارية بما في ذلك نسخ الاجتماعات والحضور وتدوين الملاحظات</li> <li>• تجميع بيانات الاهتمام من أعضاء فريق مراجعة التنفيذ</li> <li>• تعيين منسق لمجلس GNSO</li> <li>• إنشاء ميثاق جماعي</li> </ul>

<sup>2</sup> راجع لوائح ICANN الداخلية، في الملحق "أ"، القسم 10، "يجوز لمجلس GNSO ولكن ليس مطلوباً منه، توجيه إنشاء فريق مراجعة التنفيذ للمساعدة في تنفيذ السياسة".

<p>أثناء المكالمات (المكالمات) الأولية مع فريق مراجعة التنفيذ، سيراجع قائد مشروع قسم النطاقات العالمية دور فريق مراجعة التنفيذ ومبادئ التشغيل. ستغطي هذه المراجعة بحد أدنى ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إطار عمل تنفيذ سياسات الإجماع</li> <li>• مبادئ وإرشادات فريق مراجعة التنفيذ<sup>3</sup></li> <li>• منهجية صنع القرارات المعيارية<sup>4</sup></li> <li>• تقرير التوصيات النهائية لمجموعة عمل سياسة GNSO والتنفيذ<sup>5</sup></li> <li>• إجراءات تشغيل GNSO، بما في ذلك مراجعة مساهمات GNSO وإرشاداتها وإجراءات عملية وضع السياسة المعجلة<sup>6</sup></li> </ul>			
<p>بمجرد تمرير مجلس الإدارة لقرار، تقوم فريق الخدمة لدى السجل/أمناء السجلات بتخصيص عضو من فريق الإدارة لقيادة عملية التنفيذ. ويلتزم عضو فريق GDD هذا بالتنسيق مع فريق عمل سياسة GNSO لإكمال السياسة حتى تسليم عملية التنفيذ. وعند التسليم، يتحمل فريق GDD المسؤولية عن إبلاغ وإيصال حالة المشروع.</p>	<p>فريق سياسة GNSO، فريق قسم النطاقات العالمية</p>	<p>قيادة فريق سياسات GNSO إلى التحول لفريق تنفيذ قسم النطاقات العالمية</p>	<p>الخطة</p>
<p>سيحدد موظفو قسم النطاقات العالمية مخرجات المشروع وسيقومون بإنشاء مسودة خطة التنفيذ - بما في ذلك المراحل الرئيسية والتواريخ المستهدفة وأوصاف المشكلات التي يجب معالجتها - لتقديمها إلى فريق مراجعة التنفيذ، بدءًا من نموذج خطة المشروع وإجراء التعديلات حسب الحاجة لاستيعاب المشروع.<sup>7</sup></p>	<p>فريق عمل قسم النطاقات العالمية</p>	<p>إنشاء مسودة خطة التنفيذ</p>	<p>الخطة</p>
<p>عندما تتطلب عملية وضع السياسات تغييرات على سياسة إجماع حالية أو إنشاء سياسة إجماع جديدة، سيقوم قسم النطاقات العالمية بإنشاء مشروع اقتراح لغة سياسة إجماع لبدء مناقشات التنفيذ.</p> <p>إذا تطلبت توصيات السياسة إنشاء خدمة أو تغييرات جديدة على خدمة حالية، فسوف يقوم فريق قسم النطاقات العالمية بإنشاء متطلبات أولية من أجل الأنظمة ومشاركة الجهات الأخرى للخدمات الجديدة/المتغيرة. سيقوم قسم النطاقات العالمية بالتنسيق مع فرق مؤسسة ICANN المتأثرة للتصوير للاستعداد التشغيلي، حسب الحاجة.</p>	<p>موظفو قسم النطاقات العالمية، مكتب المستشار العام، الامتثال التعاقدية</p>	<p>إنشاء مسودة صياغة لسياسة الإجماع (إذا كانت منطبقة) ومتطلبات الخدمات (إذا لزم)</p>	<p>الخطة</p>
<p>مسودة صياغة سياسة الإجماع يجب أن يتم توزيعها على IRT والاجتماع (الاجتماعات) يجب أن تعقد من أجل توضيح أو تحسين الصياغة وجهات متسقة من هدف توصيات السياسة.</p> <p>إذا توصل فريق مراجعة التنفيذ إلى أن التنفيذ المخطط لفريق العمل الخاصة بتوصيات سياسة الإجماع غير متسق مع الهدف المحدد لتوصيات سياسة الإجماع، فيجوز لفريق مراجعة التنفيذ التشاور مع مجلس GNSO وفقًا لما هو محدد في مبادئ وإرشادات فريق مراجعة التنفيذ.<sup>8</sup></p>	<p>فريق عمل GDD، فريق سياسة GNSO بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT</p>	<p>إشراك فريق مراجعة التنفيذ</p>	<p>التحليل والتصميم</p>

<sup>3</sup> راجع <https://www.icann.org/en/system/files/files/irt-principles-guidelines-23aug16-en.pdf>

<sup>4</sup> راجع القسم 3.6 من إرشادات مجموعة عمل GNSO على <https://gns0.icann.org/en/council/annex-1-gns0-wg-guidelines-07apr11-en.pdf>

<sup>5</sup> راجع <https://gns0.icann.org/en/drafts/policy-implementation-recommendations-01jun15-en.pdf>

---

<sup>6</sup> راجع <https://gns0.icann.org/en/council/procedures>

<sup>7</sup> راجع لوائح ICANN الداخلية، في الملحق أ، القسم 10، "فور اتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس الإدارة باعتماد السياسة، يقوم مجلس الإدارة، حيثما كان ذلك مناسباً، بمنح التحويل أو التوجيه إلى العاملين في ICANN للتعاون مع مجلس GNSO لوضع خطة تنفيذ بناءً على تنفيذ التوصيات المحددة في التقرير النهائي، ولتنفيذ السياسة.

<sup>8</sup> راجع <https://www.icann.org/en/system/files/files/irt-principles-guidelines-23aug16-en.pdf>. قد يشمل ذلك بدء عملية إدخال (GIP) GNSO أو عملية توجيه (GGP) GNSO أو عملية وضع السياسة المعجلة (EPDP) بما يتناسب مع المشكلة المطروحة. يمكن العثور على التفاصيل على صفحة <https://gns0.icann.org/en/council/procedures>

<p>إذا تطلب التنفيذ إجراء تغييرات على الخدمات الحالية أو بناء خدمة جديدة، فيجب على قائد التنفيذ التشاور مع موفري الخدمة والخبراء الفنيين بأسرع ما يمكن لضمان تضمين وجهات النظر تلك من بداية عملية التنفيذ. يمكن أن تشمل هذه العملية إصدار RFI أو RFP.</p>	<p>فريق عمل GDD، بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT</p>	<p>إشراك أطراف أخرى إضافية حسبما يكون ضروريًا من أجل التنفيذ (موفرو الخدمة، والخبراء الفنيين، إلخ)</p>	<p>التحليل والتصميم</p>
<p>سيحدد فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بالتشاور مع IRT (إن أمكن)، ما إذا كان يجب نشر التنفيذ المقترح للتعليق العام (هناك افتراض قوي بأنه سيتم نشر العناصر للتعليق العام). وإذا كان الأمر كذلك، فإن صياغة سياسة الإجماع المقترحة و/أو التفاصيل الخاصة بالخدمة الجديدة بالإضافة إلى خطة التنفيذ سوف يتم نشرها للتعليق العام.</p>	<p>فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT</p>	<p>طلب الحصول على التعليقات العامة حول صياغة السياسة المقترحة وخطة التنفيذ (إذا كان منطبقًا)</p>	<p>التحليل والتصميم</p>
<p>سوف يقوم قسم النطاقات العالمية بتعديل صياغة السياسة المقترحة استنادًا إلى التعليقات العامة، وذلك بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT (إذا كان ذلك منطبقًا).</p>	<p>فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT</p>	<p>وضع الصياغة النهائية للسياسة (إذا كان ذلك منطبقًا)</p>	<p>التحليل والتصميم</p>
<p>سوف يقوم فريق عمل قسم النطاقات العالمية بإكمال جميع العناصر المطلوبة للخدمة الجديدة المقترحة استنادًا إلى التعليقات العامة، بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT (إذا كان ذلك منطبقًا) بعد التشاور مع موفري الخدمات المعنيين.</p>	<p>فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT</p>	<p>إكمال الخدمة المقترحة الجديدة (إذا كان ذلك منطبقًا)</p>	<p>التحليل والتصميم</p>
<p>سوف يتشاور فريق عمل قسم النطاقات العالمية مع فريق العمل المعني (حسب الحاجة) وفريق مراجعة التنفيذ (أو GNSO في حال لم يكن هناك فريق مراجعة التنفيذ) على الصياغة النهائية للسياسة و/أو الخدمة (الخدمات).</p>	<p>فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT</p>	<p>التشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT وفريق العمل المعني فيما يخص مسودة الصياغة النهائية للسياسة و/أو خدمة مقترحة جديدة</p>	<p>التحليل والتصميم</p>
<p>في حالة تغيير الصياغة النهائية للسياسة و/أو الخدمة المقترحة تغييرًا ماديًا بعد فترة التعليق العام الأولية، فسوف يسعى فريق عمل قسم النطاقات العالمية للحصول على التعليقات العامة على الصياغة/الخدمة الحديثة قبل أن يتم تنفيذها.</p>	<p>فريق عمل قسم النطاقات العالمية</p>	<p>طلب التعليقات العامة الإضافية إلى لزم</p>	<p>التحليل والتصميم</p>
<p>بمجرد مراجعة جميع فرق العمل وموفري الخدمات وفريق IRT ذي الصلة لصياغة/خدمة السياسة النهائية، يجب الإعلان عن المنتج النهائي للجمهور وأصحاب المصلحة المعنيين. يجب نشر ترجمات السياسة النهائية على موقع الويب الخاص بمؤسسة ICANN في هذه المرحلة أو قبل ذلك.</p>	<p>فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT</p>	<p>إكمال صياغة السياسة و/أو الخدمة الجديدة</p>	<p>التحليل والتصميم</p>



التحليل والتصميم	تحديد تاريخ لسريان السياسة	فريق عمل قسم النطاقات العالمية، بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ IRT	تحديد تاريخ معقول يمكن للأطراف المتعاقدة أن تنفذ فيه التغييرات لكي تصبح متوافقة مع الهدف من سياسة الإجماع.
التنفيذ	إعلان تاريخ سريان السياسة	فريق عمل قسم النطاقات العالمية	يجب أن يكون تاريخ سريان السياسات المقترحة قد تم تحديده/نشره بالفعل، ولكن هذا يمثل المرحلة الرسمية. يجب تقديم الإشعار القانوني الرسمي، كما هو مطلوب بموجب اتفاقيات السجل واتفاقية أمين السجل، إلى الأطراف المتعاقدة. يجب إرسال الإشعار بالبريد الإلكتروني إلى الأطراف المتعاقدة ونشر ذلك على موقع ICANN على الويب في قسم "سياسات الإجماع".
التنفيذ	وضع المواد التعليمية ومواد التوعية	فريق عمل قسم النطاقات العالمية	سوف يقوم فريق قسم النطاقات العالمية بالتنسيق مع فريق الاتصالات والامتثال من أجل إنشاء أية مواد لازمة من أجل طلب الحصول على تغييرات السياسة عبر الأطراف المتعاقدة ومجتمع الإنترنت العام. تشمل البنود ندوات الويب، والأسئلة المتداولة، والمستندات المتاحة إلى الإنترنت، وطلبات الخدمة/التوافق، إلخ.
التنفيذ	التواصل العالمي	فريق عمل قسم النطاقات العالمية	سوف يقوم فريق قسم النطاقات العالمية بجدولة سلسلة من ندوات الويب من أجل توعية وتنقيف أصحاب المصلحة المتأثرين حول التغييرات المتعلقة على السياسات (إذا لزم ذلك). يعمل فريق عمل قسم النطاقات العالمية أيضًا مع الأطراف ذات الصلة للتعامل مع أي مشكلات غير متوقعة قد تنشأ أثناء تنفيذ السياسة.
التنفيذ	إرسال إشعارات تذكيرية	فريق عمل قسم النطاقات العالمية	يجب إرسال إشعارات تذكيرية حول تاريخ سريان السياسة القادم إلى الأطراف المتعاقدة قبل تاريخ السريان بمدة 30 يومًا وفي تاريخ السريان.
التنفيذ	نشر تغيير سياسة الإجماع	فريق عمل قسم النطاقات العالمية	تمثل هذه الركيزة نهاية أعمال التنفيذ الخاصة بقسم النطاقات العالمية. يجب أن تحتوي خطة التنفيذ و/أو مستندات المتطلبات و/أو خطط المشروع على جدول زمني مفصل للمهام الفرعية والتفاصيل المرتبطة بتنفيذها. تدخل سياسة الإجماع حيز التنفيذ ويصبح قسم الامتثال مسؤولاً عن مراقبة السياسة وإنفاذها.
الدعم والمراجعة	التحسين المستمر وقياس فعالية السياسة	فريق عمل قسم النطاقات العالمية وموظفو سياسة GNSO وقسم الامتثال والمتعاقدون والأطراف الثالثة حسب الاقتضاء لاحتياجات جمع البيانات	يعتبر قياس فاعلية سياسة الإجماع أمرًا مهمًا لفهم إذا ما استوفت تغييرات السياسة الأهداف المحددة بمعرفة GNSO. لتحقيق هذه الغاية، يجب تحديد سلسلة من المقاييس وجمعها لقياس السياسة عبر خدمات ICANN بمجرد أن تصبح السياسة سارية. يجب تضمين أي بيانات ومقاييس ذات صلة في تقرير الامتثال السنوي ومصادر الإبلاغ الأخرى، وإاحتاحتها لتقرير حالة سياسة ما بعد التنفيذ وأي مراجعة لاحقة للسياسة.
الدعم والمراجعة	المراجعة الرسمية (إذا انطبق ذلك)	فريق عمل GNSO، فريق قسم النطاقات العالمية	إذا كانت سياسة إجماع تحتوي على مراجعة لفريق عمل رسمي بعد تاريخ سريانها، أو في حالة دعوة مجلس GNSO أو مجلس إدارة ICANN لإجراء مراجعة رسمية، فسوف تقوم شعبة النطاقات العالمية قسم النطاقات العالمية و/أو فريق السياسات بالبدء في هذه العملية.

<p>بعد توفر الوقت الكافي لتقديم البيانات والمقاييس لتقييم توصيات السياسة المنفذة، يجب على طاقم الامتثال وسياسة GNSO تقديم تقرير حالة سياسة ما بعد التنفيذ إلى مجلس GNSO مع البيانات والمقاييس الكافية لتقييم تأثير السياسة. ما لم يتم التوصية بإطار زمني لجمع البيانات وإعداد التقارير بشكل خاص من قبل مجموعة عمل عملية وضع السياسات، يجب تقديم تقرير حالة السياسة بشكل عام في غضون 18 إلى 24 شهرًا من تاريخ سريان السياسة. قد يعمل تقرير حالة السياسة باعتباره أساسًا لمزيد من المراجعة و/أو المراجعات لتوصيات السياسة إذا كان ذلك مناسبًا.</p>	<p>الامتثال، فريق سياسة GNSO</p>	<p>تقرير حالة سياسة ما بعد التنفيذ</p>	<p>الدعم والمراجعة</p>
--	----------------------------------	--	------------------------
